

Le compte-rendu de réunion de chantier, établi par le maître d'ouvrage ou son représentant, a valeur d'instruction pour toutes les observations formulées envers les entreprises. En l'absence de remarques écrites dans un délai de 8 (huit) jours ou à la réunion suivante, le présent compte-rendu sera considéré comme accepté par tous les destinataires.

HÔTEL DE COMMUNAUTÉ
6 rue de Valdepeñas CS 10216
16111 Cognac Cedex
tél. 05 45 36 64 30
contact@grand-cognac.fr
◆ www.grand-cognac.fr

MAITRE D'OUVRAGE : GRAND COGNAC
MAITRE D'OEUVRE : GRAND COGNAC

OPERATION : Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement – Rue Pasteur – Jarnac

**La prochaine réunion de chantier aura lieu le :
Vendredi 26/05/2023 à 9h30 au droit des travaux**

Rédigé par Alain MALLET le 12/05/2023

Structure	Nom	Coordonnées	Présent	Envoi
Grand Cognac	M VILLEGER	m.villeger@chateauneuf16120.fr	E	X
	Mme HAURET CLOS	christine.hauret-clos@grand-cognac.fr	E	X
	M LOLMEDE	philippe.lolmede@grand-cognac.fr	E	X
	M MALLET	alain.mallet@grand-cognac.fr 06 72 81 18 54	P	X
Commune de Jarnac	Mairie	mairie@ville-de-jarnac.fr		X
	M CHARRIER	charrier.claude@orange.fr - 06 37 05 75 99	P	X
	M JOLY	phillippe.joly@wanadoo.fr - 06 10 31 29 66	E	X
	Services techniques			
	M BATY	responsable.st@ville-de-jarnac.fr -06 70 48 15 94	E	X
	M LEGRIS	l.legris@ville-de-jarnac.fr - 06 32 08 12 63	P	X
SOGEA	M EVENOU (Responsable agence)	gilles.evenou@vinci-construction.fr	E	X
	M GALLAIS (Directeur travaux)	matthieu.gallais@vinci-construction.fr	E	X
	M Rougier (Conducteur de travaux)	cedric.rougier@vinci-construction.fr - 06 19 23 31 72	P	X
	Dimitri (Chef de chantier)		P	
ADA JARNAC	M PEROT (Chef d'agence)	jperot@lacharente.fr	E	X
	M LAUVIGÉ (Responsable secteur)	jplauvige@lacharente.fr 06 31 63 98 31	E	X
	M ROBIN	serobin@lacharente.fr 06 73 16 13 68	P	X
AGUR	M THOMAS (Chef d'agence)	julien.thomas@agur.fr – 06 88 80 91 04	E	X
	M YUNTA	j.yunta@agur.fr – 06 65 61 72 10	P	X
CALITOM	M GUERRY	fatima.guerry@grand-cognac.fr	E	X
	M DEFONTAINE	edefontaine@calitom.com	E	X
	M MONTEIRO	pmonteiro@calitom.com	E	X
	M PELLISON	yann.pellisson@paprec.com	E	X
TRANSPORT	M CARLESSO	matthieu.carlesso@grand-cognac.fr	E	X

I. RAPPEL DE L'OPERATION :

La commune de Jarnac s'est engagée dans une démarche d'aménagement de la rue de Pasteur et de l'avenue du Général Leclerc. En parallèle, Grand Cognac procède au renouvellement du réseau et de ses branchements d'eau potable et au renouvellement des branchements d'assainissement.

Grand Cognac a confié ces travaux à l'entreprise SOGEA. Il consiste à la pose de 1400 ml de canalisation décomposés de la façon suivantes : 260 ml de fonte 250mm, 570 ml de fonte 200mm, 580 ml de fonte 100mm, 100 ml de PVC 63mm, 280 ml de PVC 75mm, aux amorces sur les antennes et aux renouvellements des 99 branchements d'eau potable et 74 branchements d'assainissement.

L'enveloppe des travaux est de 1 138 656 €HT.



II. SITUATION ADMINISTRATIVE :

Date du marché subséquent : 27/10/2022

OS de préparation : à compter du **9/01/2023** - OS de démarrage : à compter du **13/02/2023**

DT : réalisée par Grand Cognac 22/03/2022 - Récépissé transmis à l'entreprise

DICT : à réaliser et à transmettre par l'entreprise – [retour à faire](#)

Constat d'huissier : à réaliser et à fournir par l'entreprise – [retour à faire](#)

Arrêté de circulation – permission de voirie : à réaliser et à fournir par l'entreprise – [retour à faire](#)

PPSPS : à réaliser et à fournir par l'entreprise – [retour à faire](#)

Plan d'exécution : à réaliser et à fournir par l'entreprise [transmis](#)

Fiches produits à transmettre par l'entreprise – [retour à faire](#)

III. COORDINATION, OBSERVATIONS

1. Planning prévisionnel

Les délais d'exécution contractuels sont de 11 mois.

Démarrage des travaux à compter du 13/02/2023 (section en parallèle de la pose de l'assainissement) puis au cours du second trimestre 2023 pour 11 mois ([planning et phasage à transmettre](#)).

Enceinte des réservoirs : jusqu'à la semaine 20

Renouvellement des branchements d'eau : jusqu'à la semaine 21

Reprise de la pose des conduites d'eau potables : à partir de la semaine 21

Renouvellement des branchements d'assainissement : à partir de la semaine 27

Réfection provisoire : semaine 30



2. Informations des usagers

Information générale par Grand Cognac en lien avec l'avenue G Leclerc

Un complément est à prévoir pour la rue St Dominique / PI C. de Gaule. A programmer en fonction du planning => [à la demande de M CHARRIER, information écrite uniquement](#)

3. Avancement du chantier

Au 12/05/2023

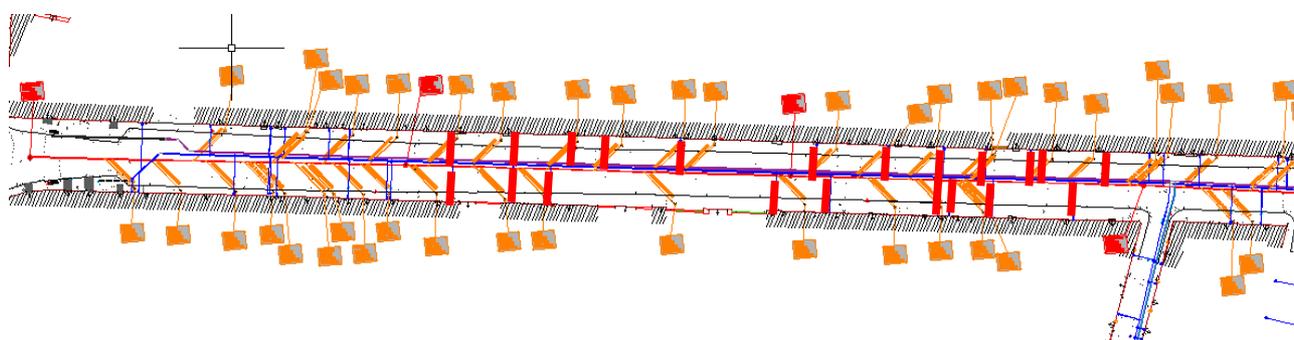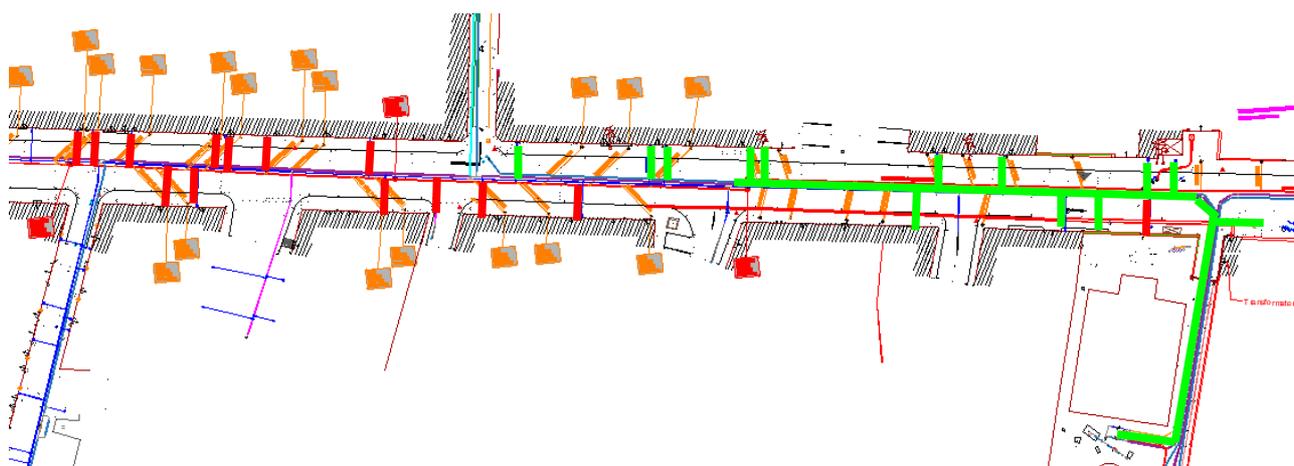

— en cours — réalisé ○ Sondage

Gestion des HAP issus du rabotage de la première phase (avenue du Général Leclerc) :
Mise en œuvre en remblaiement inférieur au pied de la tour.

Réalisation des sondages sur la rue Croix Saint Gilles :

- => sondage à réaliser au niveau du poteau d'incendie afin de vérifier les positionnements des réseaux ;
- => mise à jour du plan d'exé à réaliser.

Conduite eau potable :

- Pose du regard (clapet anti-retour) dans l'enceinte des réservoirs ;
- Fin de la pose des conduites dans l'enceinte des réservoirs pour la semaine 20 ;
- Reprise de la pose des trois conduites à partir de la semaine 21 (22/05)

Renouvellement des branchements :

- Poursuite du dégagement des branchements à l'aspiratrice jusqu'au n° 27 ;
- Relance effectuée par AGUR pour le n° 83 (demande d'un autre branchement d'eau potable et d'assainissement) => pas de réponse ;
- Présence de branchements bande bleu
 - => vérification de leur âge = pas d'âge mais PN10 et non PN 16 => renouvellement à réaliser jusqu'à l'ancien compteur ;
- Renouvellement des branchements coté paire entrepris afin de minimiser la gêne pour les riverains ;
- Pas de réfection provisoire en enrobé à froid en raison de l'ouverture de la tranchée pour la pose des réseaux dans la continuité.

Désamiantage :

Poursuite du dégagement de quelques branchements à proximité immédiate des branchements d'eau potable ;
Contrainte de la localisation des culottes prise en compte ;
Désamiantage prévu après la pose de la conduite d'eau.

Au 05/05/2023

Gestion des HAP issus du rabotage de la première phase (avenue du Général Leclerc) :

Confirmation du taux compris entre 50 et 500 mg/kg suite à la seconde analyse =

- => gestion en réemploi au-dessus de l'enrobage après mise en œuvre d'un géotextile au niveau de la fouille au pied du réservoir sur tour (parcelle AR237) ;
- => prévoir de réaliser le géoréférencement de la zone (Z, Y, X) ;
- => mettre en place le suivi et la traçabilité (BDSA ou PV).

Réalisation des sondages sur la rue Croix Saint Gilles :

- => conduite de distribution déjà renouvelée en PVC jusqu'à la rue Pasteur ;
- => présence de deux fontes dont une pour le refoulement AEP ;
- => confirmation des nombreux réseaux en service ou hors service ;
- => raccordement au plus court sur la distribution en PVC = reprise du profil afin de permettre le croisement du refoulement ;
- => pose du refoulement (200 fonte) et de la surpression (75 PVC) dans la même tranchée (à gauche en descendant) coté opposé au PVC ;
- => sondage à réaliser au niveau du poteau d'incendie afin de vérifier les positionnements des réseaux ;
- => pas de dépose du réseau d'assainissement – ITV rue des Moines transmises ce jour ;
- => mise à jour du plan d'exé à réaliser.

Conduite eau potable :

Pose des réseaux (distribution 250 fonte, refoulement 200 fonte et surpressé 100 fonte) depuis le pied du château jusqu'à la rue de la Cote en parallèle de l'assainissement ;
Réfection en bicouche ;
Réseaux surpressé en attente au niveau du 150 fonte (départ coté av Gal Leclerc) ;
Pose des réseaux en attente – reprise après le renouvellement des branchements d'eau sur la rue Pasteur.

Renouvellement des branchements :

Dégagement des branchements à l'aspiratrice depuis la rue de la Cote jusqu'au n° 57 ;
Mis en place de nourrices alimentées par un PEHD de 40 mm pour les n° 93 et 70 (3 et 7 compteurs) ;
N° 89 deux compteurs ;
Relance à effectuer par AGUR pour le n° 83 (demande d'un autre branchement d'eau potable et d'assainissement) ;
Présence de quelques branchements bande bleu
=> vérification de leur âge (ex n° 69B) ;
Présence de rocher à faible profondeur (environ 40-50 cm de profondeur) à partir du n° 67 ;
Réfection en enrobé à froid avant basculement coté paire (dans deux semaines).

Désamiantage :

ITV rue Pasteur transmise ce jour ;
Dégagement de quelques branchements à proximité immédiate des branchements d'eau potable ;
Branchement du n° 62 au 64 en cascade sous le trottoir ;
=> à séparer avec création d'une culotte sur le réseau principal ;
=> même approche pour les n° 79 à 85B
Branchement n° 73 pris en amont => vérification AGUR.

4. Points particuliers

Gestion de voirie

Travaux en route barrée sur l'ensemble des voies communales et RD.

CALITOM :

Continuité du dispositif mis en place sur la première tranche de travaux

Transport scolaire :

Pas de ligne

Branchement particulier :

Les niches à compteurs seront implantées autant que possible sur le domaine public.
Les projets d'urbanisme sont à faire remonter. La mairie se rapproche des pétitionnaires.

Défense incendie :

Déplacement du PI au niveau de la place Charle de Gaulle à mettre en retrait (1,40m) dans le massif végétal
[Devis à transmettre par SOGEA pour le renouvellement de PI au niveau des réservoirs](#)

Gestion des raccordements des branchements neufs sur compteurs :

Réalisé par SOGEA jusqu'au robinet d'arrêt / Compteur à fournir par AGUR
Assurer l'étanchéité au niveau des passage de mur.

Gestion des raccordements récents :

Les branchements réalisés en PEHD bande bleu (moins de 10 ans) ne seront pas renouvelés. Ils seront repris au plus court par électro-soudure.

5. Points techniques

Base de vie / stockage des matériaux :

Continuité de l'opération av G Leclerc

Gestion des vannes :

Les vannes seront manœuvrées par l'exploitant
L'état est à confirmer par l'exploitant pour les vannes.
Bouche à clé ronde = vanne
Bouche à clé carré = branchement
Bouche à clé hexagonale = purge

Gestion des dégradations du réseau ou des branchements d'eau potable :

A définir

Gestion des urgences de chantier :

Voir avec le conducteur de travaux

Repérage des vannes et branchements

L'exploitant AGUR procédera au repérage des ouvrages et aux essais de manœuvre.
Repérage des conduites neuves au niveau du giratoire rues de Condé/Pasteur => AGUR

IV. AUTRES

Nombre de jours d'intempéries : 0

Nombres de retards ou d'absences aux réunions : 0

Zone de raccordement et regards techniques au niveau des réservoirs :



Renouvellement de branchements :

