

Le compte-rendu de réunion de chantier, établi par le maître d'ouvrage ou son représentant, a valeur d'instruction pour toutes les observations formulées envers les entreprises. En l'absence de remarques écrites dans un délai de 8 (huit) jours ou à la réunion suivante, le présent compte-rendu sera considéré comme accepté par tous les destinataires.

**HÔTEL DE COMMUNAUTÉ**  
6 rue de Valdepeñas CS 10216  
16111 Cognac Cedex  
tél. 05 45 36 64 30  
contact@grand-cognac.fr  
◆ [www.grand-cognac.fr](http://www.grand-cognac.fr)

**MAITRE D'OUVRAGE : GRAND COGNAC**  
**MAITRE D'OEUVRE : GRAND COGNAC**

**OPERATION : Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement – Rue Pasteur – Jarnac**

**La prochaine réunion de chantier aura lieu le :  
Vendredi 23/06/2023 à 9h00 au droit des travaux**

Rédigé par Alain MALLET le 19/06/2023

Structure	Nom	Coordonnées	Présent	Envoi
Grand Cognac	M VILLEGER	m.villeger@chateauneuf16120.fr	E	X
	Mme HAURET CLOS	christine.hauret-clos@grand-cognac.fr	E	X
	M LOLMEDE	philippe.lolmede@grand-cognac.fr	E	X
	M MALLET	alain.mallet@grand-cognac.fr 06 72 81 18 54	P	X
Commune de Jarnac	Mairie	mairie@ville-de-jarnac.fr		X
	M CHARRIER	charrier.claudef@orange.fr - 06 37 05 75 99	E	X
	M JOLY	philippe.joly@wanadoo.fr - 06 10 31 29 66	E	X
	Services techniques M BATY M LEGRIS	responsable.st@ville-de-jarnac.fr -06 70 48 15 94 l.legris@ville-de-jarnac.fr - 06 32 08 12 63	P P	X X
SOGEA	M EVENOU (Responsable agence)	gilles.evenou@vinci-construction.fr	E	X
	M GALLAIS (Directeur travaux)	matthieu.gallais@vinci-construction.fr	E	X
	M ROUGIER (Conducteur de travaux)	cedric.rougier@vinci-construction.fr - 06 19 23 31 72	P	X
	Dimitri (Chef de chantier)		P	
ADA JARNAC	M PEROT (Chef d'agence)	jperot@lacharente.fr	E	X
	M LAUVIGÉ (Responsable secteur)	jplauvige@lacharente.fr 06 31 63 98 31	E	X
	M ROBIN	serobin@lacharente.fr 06 73 16 13 68	E	X
AGUR	M THOMAS (Chef d'agence)	julien.thomas@agur.fr – 06 88 80 91 04	E	X
	M YUNTA	j.yunta@agur.fr – 06 65 61 72 10	P	X
CALITOM	M GUERRY	fatima.guerry@grand-cognac.fr	E	X
	M DEFONTAINE	edefontaine@calitom.com	E	X
	M MONTEIRO	pmonteiro@calitom.com	E	X
	M PELLISON	yann.pellisson@paprec.com	E	X
TRANSPORT	M CARLESSO	matthieu.carlesso@grand-cognac.fr	E	X

## I. RAPPEL DE L'OPERATION :

La commune de Jarnac s'est engagée dans une démarche d'aménagement de la rue de Pasteur et de l'avenue du Général Leclerc. En parallèle, Grand Cognac procède au renouvellement du réseau et de ses branchements d'eau potable et au renouvellement des branchements d'assainissement.

Grand Cognac a confié ces travaux à l'entreprise SOGEA. Il consiste à la pose de 1400 ml de canalisation décomposés de la façon suivantes : 260 ml de fonte 250mm, 570 ml de fonte 200mm, 580 ml de fonte 100mm, 100 ml de PVC 63mm, 280 ml de PVC 75mm, aux amorces sur les antennes et aux renouvellements des 99 branchements d'eau potable et 74 branchements d'assainissement.

L'enveloppe des travaux est de 1 138 656 €HT.



## II. SITUATION ADMINISTRATIVE :

Date du marché subséquent : 27/10/2022

OS de préparation : à compter du **9/01/2023** - OS de démarrage : à compter du **13/02/2023**

DT : réalisée par Grand Cognac 22/03/2022 - Récépissé transmis à l'entreprise

DICT : à réaliser et à transmettre par l'entreprise – [retour à faire](#)

Constat d'huissier : à réaliser et à fournir par l'entreprise – [retour à faire](#) – [reprendre la rue Croix St Gilles](#)

Arrêté de circulation – permission de voirie : à réaliser et à fournir par l'entreprise – [retour à faire](#)

PPSPS : à réaliser et à fournir par l'entreprise – [retour à faire](#)

Plan d'exécution : à réaliser et à fournir par l'entreprise transmis – [à mettre à jour](#)

Fiches produits à transmettre par l'entreprise – [retour à faire](#)

## III. COORDINATION, OBSERVATIONS

### 1. Planning prévisionnel

Les délais d'exécution contractuels sont de 11 mois.

Démarrage des travaux à compter du 13/02/2023 (section en parallèle de la pose de l'assainissement) puis au cours du second trimestre 2023 pour 11 mois ([planning et phasage à transmettre - Rappel](#)).

Enceinte des réservoirs : jusqu'à la semaine 20

Renouvellement des branchements d'eau : jusqu'à la semaine 21

Reprise de la pose des conduites d'eau potables : à partir de la semaine 21

Renouvellement des branchements d'assainissement : à partir de la semaine 27

Réfection provisoire : semaine 30


### 2. Informations des usagers

Information générale par Grand Cognac en lien avec l'avenue G Leclerc

Un complément est à prévoir pour la rue St Dominique / PI C. de Gaule. A programmer en fonction du planning => [à la demande de M CHARRIER, information écrite uniquement => A réaliser pour début juillet](#) ;

### 3. Avancement du chantier

Au 16/06/2023

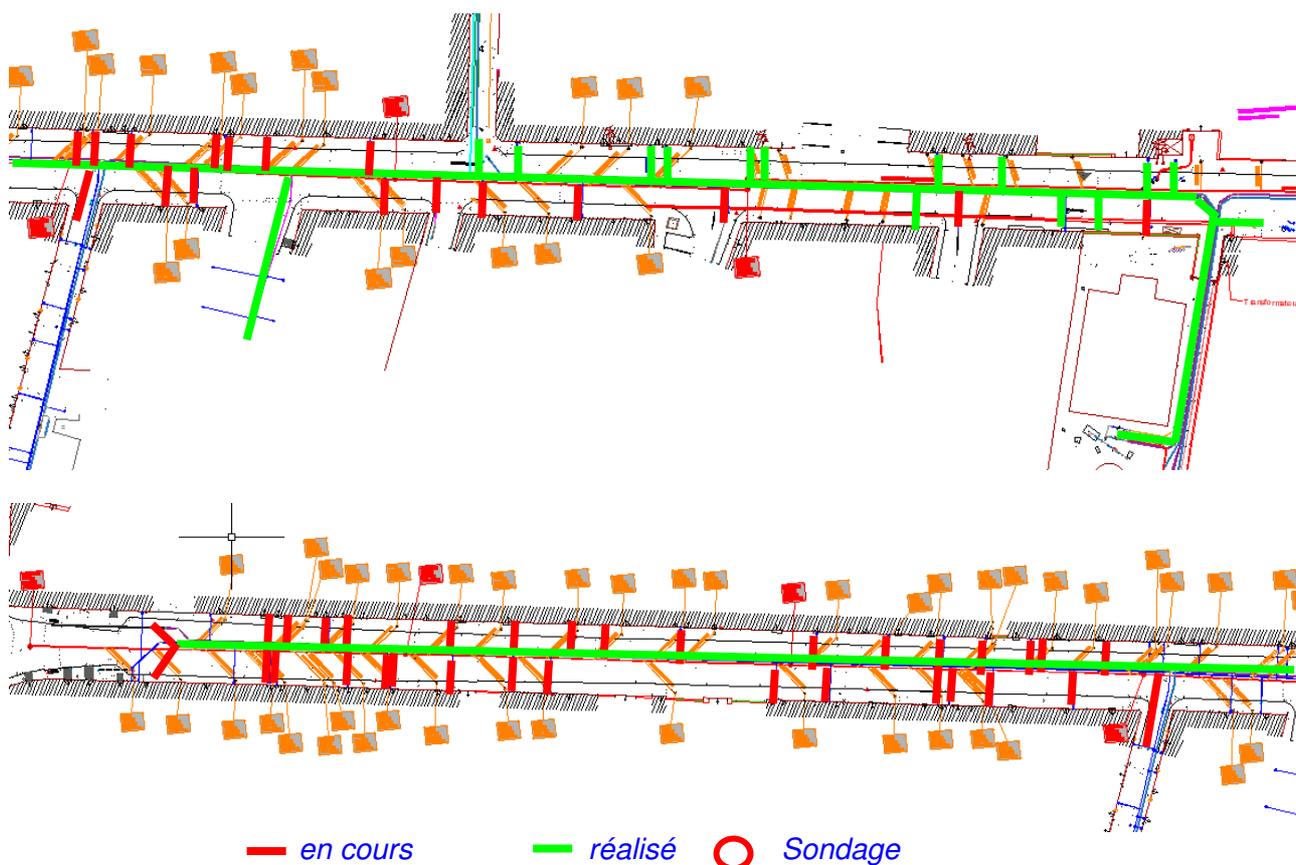

Sécurisation du chantier en vue de la brocante

Rue Croix Saint Gilles :

Conduite eau potable :

Réservoir :

Raccordement du 150 fonte réalisé ;

Raccordement du refoulement 200 fonte à programmer.

Rue Pasteur :

Raccordement des antennes vannes fermées pour les rues Saint Marc (100 fonte) et de la Côte (2 barres 110 PVC pour sortir de la zone d'emprise) pour le 22/06/2023 de 8h30 à 12 h00 ;

Changement des regards des ventouses à estampiller « EAU POTABLE » ;

Fin de la ligne rue Pasteur => préparation essai pression ;

Zone de raccordement du 200 fonte après le branchement du N°15 ;

Zone de raccordement du 100 fonte avant le branchement du N°18 ;

Reprise des deux piquages (18 et 18 Bis) sur la conduite PVC 100 existante

Renouvellement des branchements :

Ensemble des branchements dégagé

Désamiantage :

Intervention envisagée pour fin juin.

Au 09/06/2023

Gestion des HAP issus du rabotage de la première phase (avenue du Général Leclerc) :

/

Rue Croix Saint Gilles :

=> sondage à réaliser au niveau du poteau d'incendie afin de vérifier les positionnements des réseaux ;

=> mise à jour du plan d'exé à réaliser ;

Constat d'huissier à remettre à jour en raison de l'état de l'habitation en ruine.

Conduite eau potable :

Réservoir :

Raccordement du 150 fonte programmé pour le 13/06 de 8h30 à 12 h00 ;

=> Plan de coupure transmis par AGUR ;

Raccordement de l'interconnexion sur l'ancien refoulement de la Touche à programmer ;

Rue Pasteur :

Raccordement des antennes vannes fermées pour les rues Saint Marc (100 fonte) et de la Côte (2 barres 110 PVC pour sortir de la zone d'emprise) pour le 21/06/2023 de 8h30 à 12 h00 ;

Poursuite de la pose des deux conduites (distribution et suppression) jusqu'au N°39 ;

Fin de la ligne prévue pour la semaine prochaine avec essai pression programmé pour la fin de semaine ;

Zone de raccordement du 200 fonte à identifier => sondage à prévoir ;

Zone de raccordement du 100 fonte au niveau du N°18bis ;

Sondage réalisé au niveau de la rue Saint Dominique => dépose d'une conduite, déplacement de la sectorisation au niveau de la place en raison des contraintes de réseaux, ventouses à confirmer ;

Reprise des descentes de dalles à minima (exemple PVC 80mm en lieu et place des vieux aciers) vu avec la mairie ;

Vigilance sur la présence de reflux sur la zone rabotée non terrassée => nettoyage et balayage réalisé.

Renouvellement des branchements :

Relance effectuée par AGUR pour le n° 83 (demande d'un autre branchement d'eau potable et d'assainissement) => pas de réponse ;

Reste les n° 23, 18, 18bis et 19 à terrasser au niveau de la zone de raccordement sur les conduites existantes.

Désamiantage :

Reprise de certains branchements en Y (deux branchements côte à côte et sur la même culotte) validée ;

Validation mise en place de culote PVC 160/125 pour la reprise des branchements en cascade ;

Intervention envisagée pour fin juin.

#### 4. Points particuliers

Gestion de voirie

Travaux en route barrée sur l'ensemble des voies communales et RD.

CALITOM :

Continuité du dispositif mis en place sur la première tranche de travaux

Transport scolaire :

Pas de ligne

Branchement particulier :

Les niches à compteurs seront implantées autant que possible sur le domaine public.

Les projets d'urbanisme sont à faire remonter. La mairie se rapproche des pétitionnaires.

Défense incendie :

Déplacement du PI au niveau de la place Charle de Gaulle à mettre en retrait (1,40m) dans le massif végétal

Poteau d'incendie mis en œuvre.

Gestion des raccordements des branchements neufs sur compteurs :

Réalisé par SOGEA jusqu'au robinet d'arrêt / Compteur à fournir par AGUR

Assurer l'étanchéité au niveau des passages de mur.

Gestion des raccordements récents :

Les branchements réalisés en PEHD bande bleu (moins de 10 ans) ne seront pas renouvelés. Ils seront repris au plus court par électro-soudure.

## 5. Points techniques

Base de vie / stockage des matériaux :

Continuité de l'opération av G Leclerc

Gestion des vannes :

Les vannes seront manœuvrées par l'exploitant

L'état est à confirmer par l'exploitant pour les vannes.

Bouche à clé ronde = vanne

Bouche à clé carré = branchement

Bouche à clé hexagonale = purge

Gestion des dégradations du réseau ou des branchements d'eau potable :

A définir

Gestion des urgences de chantier :

Voir avec le conducteur de travaux

Repérage des vannes et branchements

L'exploitant AGUR procédera au repérage des ouvrages et aux essais de manœuvre.

Repérage des conduites neuves au niveau du giratoire rues de Condé/Pasteur => AGUR

## IV. AUTRES

Nombre de jours d'intempéries : 0

Nombres de retards ou d'absences aux réunions : 0

Terrassement antenne Rue Saint Marc :



Zone raccordement 100 Fonte :



Zone raccordement 200 Fonte :

