

Le compte-rendu de réunion de chantier, établi par le maître d'ouvrage ou son représentant, a valeur d'instruction pour toutes les observations formulées envers les entreprises. En l'absence de remarques écrites dans un délai de 8 (huit) jours ou à la réunion suivante, le présent compte-rendu sera considéré comme accepté par tous les destinataires.

**HÔTEL DE COMMUNAUTÉ**  
6 rue de Valdepeñas CS 10216  
16111 Cognac Cedex  
tél. 05 45 36 64 30  
contact@grand-cognac.fr  
◆ [www.grand-cognac.fr](http://www.grand-cognac.fr)

**MAITRE D'OUVRAGE : GRAND COGNAC**  
**MAITRE D'OEUVRE : GRAND COGNAC**

**OPERATION : Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement – Rue Pasteur – Jarnac**

**La prochaine réunion de chantier aura lieu le :  
Vendredi 07/07/2023 à 9h00 au droit des travaux**

Rédigé par Alain MALLET le 30/06/2023

Structure	Nom	Coordonnées	Présent	Envoi
Grand Cognac	M VILLEGER	m.villeger@chateauneuf16120.fr	E	X
	Mme HAURET CLOS	christine.hauret-clos@grand-cognac.fr	E	X
	M LOLMEDE	philippe.lolmede@grand-cognac.fr	E	X
	M MALLET	alain.mallet@grand-cognac.fr 06 72 81 18 54	P	X
Commune de Jarnac	Mairie	mairie@ville-de-jarnac.fr		X
	M CHARRIER	charrier.claude@orange.fr - 06 37 05 75 99	E	X
	M JOLY	phillippe.joly@wanadoo.fr - 06 10 31 29 66	E	X
	Services techniques M BATY M LEGRIS	responsable.st@ville-de-jarnac.fr -06 70 48 15 94 l.legris@ville-de-jarnac.fr - 06 32 08 12 63	P P	X X
SOGEA	M EVENOU (Responsable agence)	gilles.evenou@vinci-construction.fr	E	X
	M GALLAIS (Directeur travaux)	matthieu.gallais@vinci-construction.fr	E	X
	M ROUGIER (Conducteur de travaux)	cedric.rougier@vinci-construction.fr - 06 19 23 31 72	E	X
	Dimitri (Chef de chantier)		P	
ADA JARNAC	M PEROT (Chef d'agence)	jperot@lacharente.fr	E	X
	M LAUVIGÉ (Responsable secteur)	jplauvige@lacharente.fr 06 31 63 98 31	E	X
	M ROBIN	serobin@lacharente.fr 06 73 16 13 68	E	X
AGUR	M THOMAS (Chef d'agence)	julien.thomas@agur.fr – 06 88 80 91 04	E	X
	M YUNTA	j.yunta@agur.fr – 06 65 61 72 10	P	X
CALITOM	M GUERRY	fatima.guerry@grand-cognac.fr	E	X
	M DEFONTAINE	edefontaine@calitom.com	E	X
	M MONTEIRO	pmonteiro@calitom.com	E	X
	M PELLISON	yann.pellisson@paprec.com	E	X
TRANSPORT	M CARLESSO	matthieu.carlesso@grand-cognac.fr	E	X

## I. RAPPEL DE L'OPERATION :

La commune de Jarnac s'est engagée dans une démarche d'aménagement de la rue de Pasteur et de l'avenue du Général Leclerc. En parallèle, Grand Cognac procède au renouvellement du réseau et de ses branchements d'eau potable et au renouvellement des branchements d'assainissement.

Grand Cognac a confié ces travaux à l'entreprise SOGEA. Il consiste à la pose de 1400 ml de canalisation décomposés de la façon suivantes : 260 ml de fonte 250mm, 570 ml de fonte 200mm, 580 ml de fonte 100mm, 100 ml de PVC 63mm, 280 ml de PVC 75mm, aux amorces sur les antennes et aux renouvellements des 99 branchements d'eau potable et 74 branchements d'assainissement.

L'enveloppe des travaux est de 1 138 656 €HT.



## II. SITUATION ADMINISTRATIVE :

Date du marché subséquent : 27/10/2022

OS de préparation : à compter du **9/01/2023** - OS de démarrage : à compter du **13/02/2023**

DT : réalisée par Grand Cognac 22/03/2022 - Récépissé transmis à l'entreprise

DICT : à réaliser et à transmettre par l'entreprise – [retour à faire](#)

Constat d'huissier : à réaliser et à fournir par l'entreprise – [retour à faire](#) – [reprendre la rue Croix St Gilles](#)

Arrêté de circulation – permission de voirie : à réaliser et à fournir par l'entreprise – [retour à faire](#)

PPSPS : à réaliser et à fournir par l'entreprise – [retour à faire](#)

Plan d'exécution : à réaliser et à fournir par l'entreprise transmis – [à mettre à jour](#)

Fiches produits à transmettre par l'entreprise – [retour à faire](#)

## III. COORDINATION, OBSERVATIONS

### 1. Planning prévisionnel

Les délais d'exécution contractuels sont de 11 mois.

Démarrage des travaux à compter du 13/02/2023 (section en parallèle de la pose de l'assainissement) puis au cours du second trimestre 2023 pour 11 mois ([planning et phasage à transmettre - Rappel](#)).

Enceinte des réservoirs : jusqu'à la semaine 20

Renouvellement des branchements d'eau : jusqu'à la semaine 21

Reprise de la pose des conduites d'eau potables : à partir de la semaine 21

Renouvellement des branchements d'assainissement : à partir de la semaine 27

Réfection provisoire : semaine 30


### 2. Informations des usagers

Information générale par Grand Cognac en lien avec l'avenue G Leclerc

Un complément est à prévoir pour la rue St Dominique / PI C. de Gaule. A programmer en fonction du planning => [à la demande de M CHARRIER, information écrite uniquement => A réaliser pour début juillet](#) ;

### 3. Avancement du chantier

Au 30/06/2023

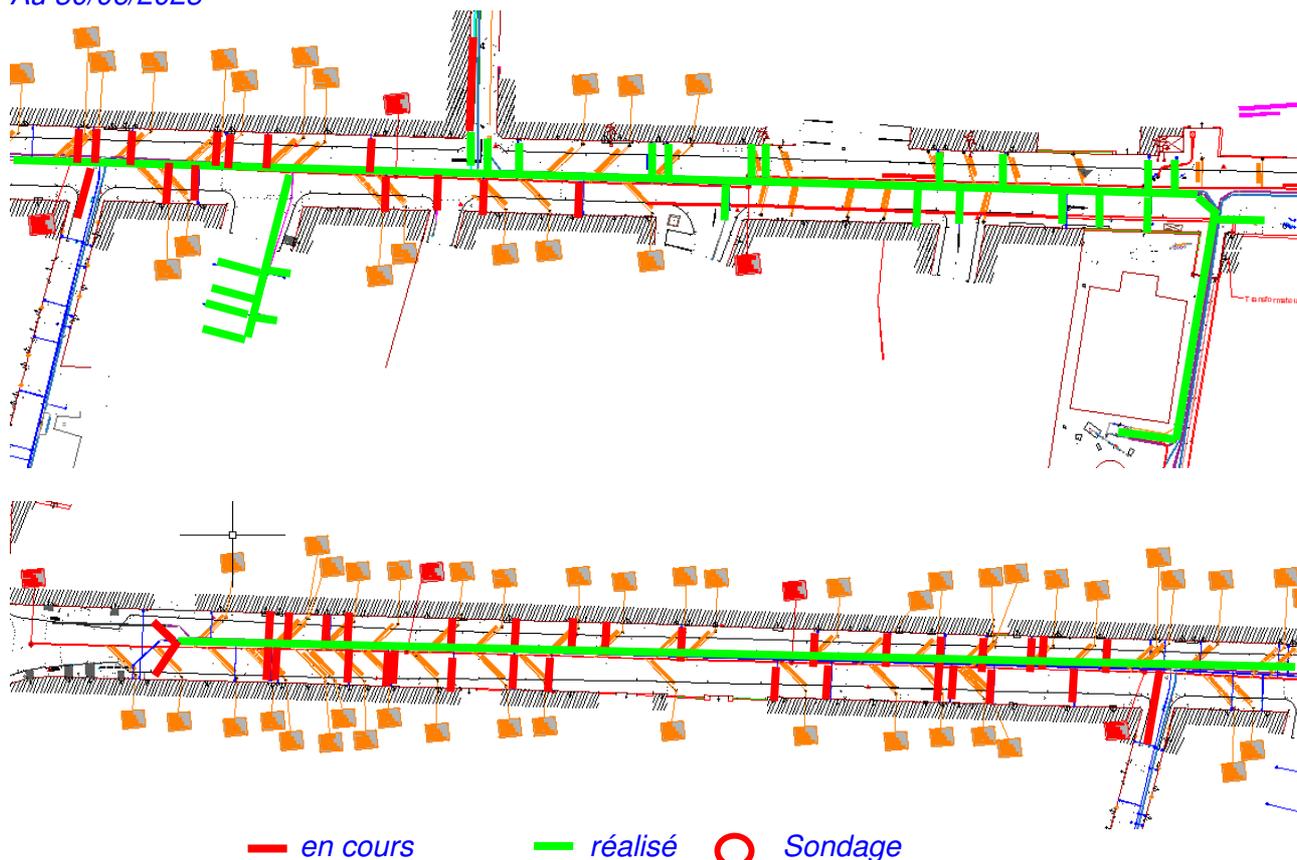

#### Conduite eau potable :

##### Réservoir :

Remise en état du site réalisée (sauf zone de raccordement du 200 fonte) ;

Raccordement de l'interco en lieu et place de l'arrivée du refoulement actuel à programmer.

##### Rue Croix Saint Gilles :

Dégagement à la pelle sur les 30-40 premiers centimètres ;

Intervention à l'aspiratrice sur 20 ml ;

Intervention ENEDIS pour consigner le vieux câble ;

=> permettre sa dépose.

Mise en œuvre de blindage lors de l'emboîtement des tuyaux ;

Distribution en PVC PN 16 de 1992 dégagé ;

=> contrainte de raccordement sur l'existante avec la présence de la vanne gaz et de son massif béton = SOGEA se rapproche de GRDF pour la dépose du regard ;

=> raccordement sur l'ancienne conduite à l'aide d'un PVC 200mm ;

=> dépose du jeu de vannes actuellement pour permettre le raccordement = alimentation de la fonte 200 existant à l'envers validé par AGUR ;

**Mise en place de grille HERAS au niveau du carrefour Moines/Croix st Gilles afin de sécuriser la zone par rapport aux piétons et aux deux roues ;**

Poursuite de la pose la semaine prochaine.

##### Rue Pasteur :

Raccordement des antennes vannes fermées pour les rues Saint Marc et de la Côte réalisé et mise en œuvre des enrobés à froid ;

Recherche de fuite sur la fonte 100 entre la rue St Dominique et le giratoire ;

=> mise en œuvre d'une vanne à cheval ;

=> dégagement de l'ensemble des tulipes ;

=> dégagement ce jour à l'aspiratrice des piquages ;

Contrôle de la potabilité sur la fonte 200/250 repris le 27/06 ;

*Plan de coupure pour le raccordement des 200 et 100 à transmettre => AGUR  
Mise en œuvre des enrobés à froid au niveau de la zone de raccordement du giratoire à réaliser.*

Renouvellement des branchements :  
*Basculement des branchements en cours ;*

Désamiantage :  
*Intervention à partir de la semaine prochaine.*

*Au 23/06/2023*

Rue Croix Saint Gilles :

*Reprise des travaux à compter de la semaine 26 ;  
Vérifier le constat d'huissier ;  
Apporter une vigilance accrue sur la stabilité de l'immeuble du N° 2 ;  
Décroustage à la pelle mécanique sur les 30-40 premiers centimètres ;  
Intervention à l'aspiratrice par la suite ;  
Remblaiement en matériau d'enrobage jusqu'à moins 0,30 m de la surface et en calcaire sans compactage jusqu'à la surface ;  
Reprise des remblaiements après la démolition de la ruine ;  
**Arrêt du chantier sur cette voie à la moindre inquiétude.***

Conduite eau potable :

Réservoir :

*Remise en état du site réalisée (sauf zone de raccordement du 200 fonte) ;  
Raccordement de l'interco en lieu et place de l'arrivée du refoulement actuel à programmer.*

Rue Pasteur :

*Raccordement des antennes vannes fermées pour les rues Saint Marc (100 fonte) et de la Côte (2 barres 110 PVC pour sortir de la zone d'emprise) reporté au 26/06/2023 de 8h30 à 12 h00 en raison des conditions climatiques du 22/06/2023 ;  
Essai pression sur la 200/250 fonte réalisé en intégralité ;  
Essai pression sur la 100 fonte réalisé jusqu'à la rue St Dominique ;  
Contrôle de la potabilité en cours ;  
Plan de coupure pour le raccordement des 200 et 100 à transmettre => AGUR.*

Renouvellement des branchements :

Contrôle de la potabilité en cours ;

*=> basculement des branchements, sous condition du retour des analyses, semaine 26 ;*

Désamiantage :

*Intervention envisagée pour fin juin.*

#### 4. Points particuliers

Gestion de voirie

Travaux en route barrée sur l'ensemble des voies communales et RD.

CALITOM :

Continuité du dispositif mis en place sur la première tranche de travaux

Transport scolaire :

Pas de ligne

Branchement particulier :

Les niches à compteurs seront implantées autant que possible sur le domaine public.  
Les projets d'urbanisme sont à faire remonter. La mairie se rapproche des pétitionnaires.

Défense incendie :

Déplacement du PI au niveau de la place Charles de Gaulle à mettre en retrait (1,40m) dans le massif végétal ;  
Poteau d'incendie mis en œuvre.

#### Gestion des raccordements des branchements neufs sur compteurs :

Réalisé par SOGEA jusqu'au robinet d'arrêt / Compteur à fournir par AGUR  
Assurer l'étanchéité au niveau des passage de mur.

#### Gestion des raccordements récents :

Les branchements réalisés en PEHD bande bleu (moins de 10 ans) ne seront pas renouvelés. Ils seront repris au plus court par électro-soudure.

### 5. Points techniques

#### Base de vie / stockage des matériaux :

Continuité de l'opération av G Leclerc

#### Gestion des vannes :

Les vannes seront manœuvrées par l'exploitant  
L'état est à confirmer par l'exploitant pour les vannes.  
Bouche à clé ronde = vanne  
Bouche à clé carré = branchement  
Bouche à clé hexagonale = purge

#### Gestion des dégradations du réseau ou des branchements d'eau potable :

A définir

#### Gestion des urgences de chantier :

Voir avec le conducteur de travaux

#### Repérage des vannes et branchements

L'exploitant AGUR procédera au repérage des ouvrages et aux essais de manœuvre.  
Repérage des conduites neuves au niveau du giratoire rues de Condé/Pasteur => AGUR

## IV. AUTRES

Nombre de jours d'intempéries : 0

Nombres de retards ou d'absences aux réunions : 0

#### Dégagement des piquages :



Rue Croix St Gilles :



Zone de raccordement :



Massif gaz à déposer :

