HÔTEL DE COMMUNAUTÉ
6 rue de Valdepeñas CS 10216
16111 Cognac Cedex
tél. 05 45 36 64 30
contact@grand-cognac.fr
www.grand-cognac.fr

COMPTE RENDU
REUNION DE CHANTIER DU 26/05/2023

Le compte-rendu de réunion de chantier, établi par le maître d'ouvrage ou son représentant, a valeur d'instruction pour toutes les observations formulées envers les entreprises. En l'absence de remarques écrites dans un délai de 8 (huit) jours ou à la réunion suivante, le présent compte-rendu sera considéré comme accepté par tous les destinataires.

MAITRE D'OUVRAGE : GRAND COGNAC
MAITRE D'OEUVRE : GRAND COGNAC

OPERATION : Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement – Rue Pasteur – Jarnac

La prochaine réunion de chantier aura lieu le :
Vendredi 2/06/2023 à 9h30 au droit des travaux

Rédigé par Alain MALLET le 30/05/2023

Structure	Nom	Coordonnées	Présent	Envoi
Grand Cognac	M VILLEGER Mme HAURET CLOS M LOLMEDE M MALLET	m.villeger@chateauneuf16120.fr christine.hauret-clos@grand-cognac.fr philippe.lolmede@grand-cognac.fr alain.mallet@grand-cognac.fr 06 72 81 18 54	E E E P	X X X X
Commune de Jarnac	Mairie M CHARRIER M JOLY Services techniques M BATY M LEGRIS	mairie@ville-de-jarnac.fr charrier.claude@orange.fr - 06 37 05 75 99 phillippe.joly@wanadoo.fr - 06 10 31 29 66 responsable.st@ville-de-jarnac.fr -06 70 48 15 94 l.legris@ville-de-jarnac.fr - 06 32 08 12 63	 E P E E	X X X X X
SOGEA	M EVENOU (Responsable agence) M GALLAIS (Directeur travaux) M Rougier (Conducteur de travaux) Dimitri (Chef de chantier)	gilles.evenou@vinci-construction.fr matthieu.gallais@vinci-construction.fr cedric.rougier@vinci-construction.fr - 06 19 23 31 72	E E E P	X X X
ADA JARNAC	M PEROT (Chef d'agence) M LAUVIGE (Responsable secteur) M ROBIN	jfperot@lacharente.fr jplauvige@lacharente.fr 06 31 63 98 31 serobin@lacharente.fr 06 73 16 13 68	E E P	X X X
AGUR	M THOMAS (Chef d'agence) M YUNTA	julien.thomas@agur.fr – 06 88 80 91 04 j.yunta@agur.fr – 06 65 61 72 10	P E	X X
CALITOM	M GUERRY M DEFONTAINE M MONTEIRO M PELLISON	fatima.guerry@grand-cognac.fr edefontaine@calitom.com pmonteiro@calitom.com yann.pellisson@paprec.com	E E E E	X X X X
TRANSPORT	M CARLESSO	matthieu.carlesso@grand-cognac.fr	E	X

I. RAPPEL DE L'OPERATION :

La commune de Jarnac s'est engagée dans une démarche d'aménagement de la rue de Pasteur et de l'avenue du Général Leclerc. En parallèle, Grand Cognac procède au renouvellement du réseau et de ses branchements d'eau potable et au renouvellement des branchements d'assainissement.

Grand Cognac a confié ces travaux à l'entreprise SOGEA. Il consiste à la pose de 1400 ml de canalisation décomposés de la façon suivantes : 260 ml de fonte 250mm, 570 ml de fonte 200mm, 580 ml de fonte 100mm, 100 ml de PVC 63mm, 280 ml de PVC 75mm, aux amorces sur les antennes et aux renouvellements des 99 branchements d'eau potable et 74 branchements d'assainissement.

L'enveloppe des travaux est de 1 138 656 €HT.

II. SITUATION ADMINISTRATIVE :

Date du marché subséquent : 27/10/2022
OS de préparation : à compter du **9/01/2023** - OS de démarrage : à compter du **13/02/2023**
DT : réalisée par Grand Cognac 22/03/2022 - Récépissé transmis à l'entreprise
DICT : à réaliser et à transmettre par l'entreprise – retour à faire
Constat d'huissier : à réaliser et à fournir par l'entreprise – retour à faire –reprendre la rue Croix St Gilles
Arrêté de circulation – permission de voirie : à réaliser et à fournir par l'entreprise – retour à faire
PPSPS : à réaliser et à fournir par l'entreprise – retour à faire
Plan d'exécution : à réaliser et à fournir par l'entreprise transmis – à mettre à jour
Fiches produits à transmettre par l'entreprise– retour à faire

III. COORDINATION, OBSERVATIONS

1. Planning prévisionnel

Les délais d'exécution contractuels sont de 11 mois.
Démarrage des travaux à compter du 13/02/2023 (section en parallèle de la pose de l'assainissement) puis au cours du second trimestre 2023 pour 11 mois (planning et phasage à transmettre - Rappel).
Enceinte des réservoirs : jusqu'à la semaine 20
Renouvellement des branchements d'eau : jusqu'à la semaine 21
Reprise de la pose des conduites d'eau potables : à partir de la semaine 21
Renouvellement des branchements d'assainissement : à partir de la semaine 27
Réfection provisoire : semaine 30

2. Informations des usagers

Information générale par Grand Cognac en lien avec l'avenue G Leclerc
Un complément est à prévoir pour la rue St Dominique / Pl C. de Gaule. A programmer en fonction du planning => à la demande de M CHARRIER, information écrite uniquement

3. Avancement du chantier

Au 26/05/2023

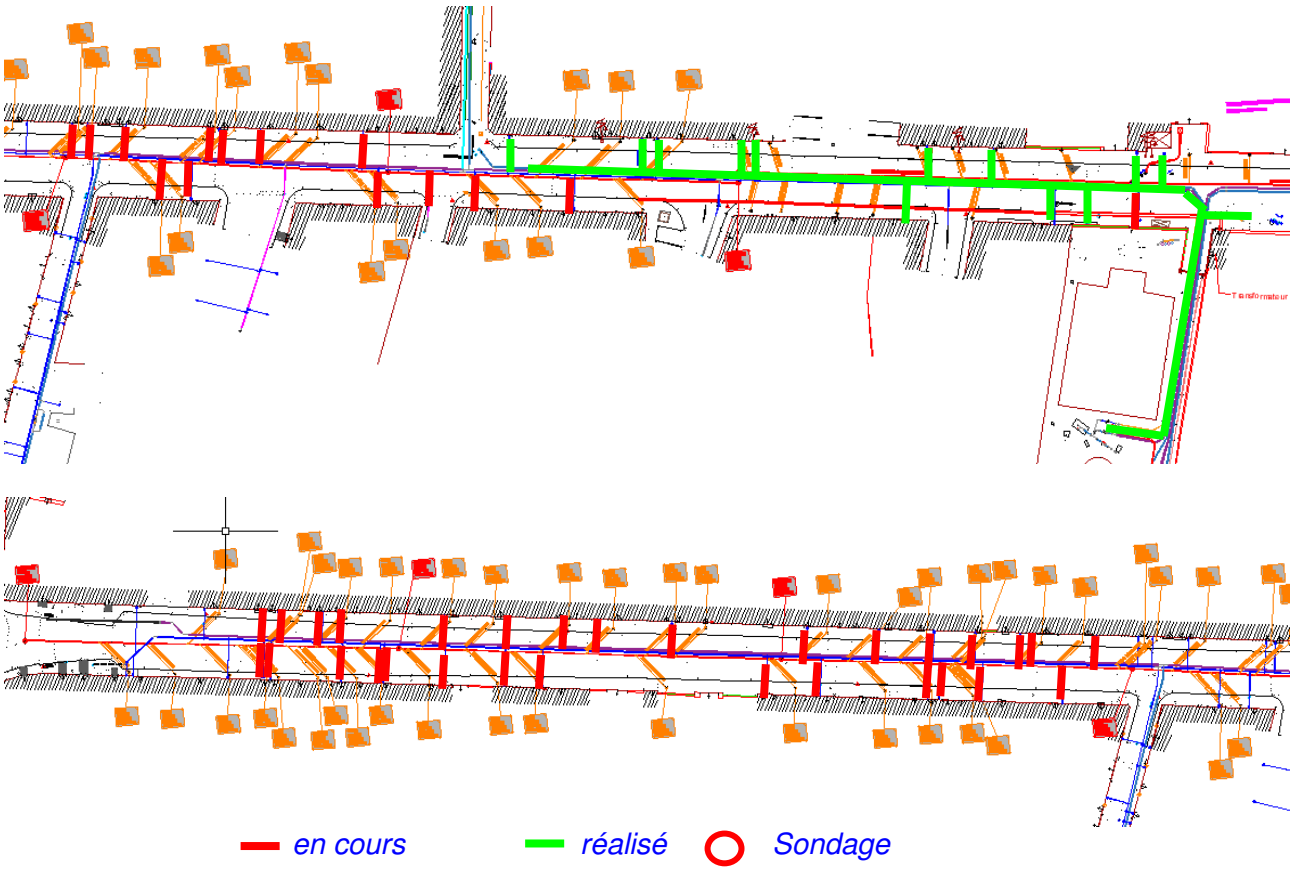

<u>Gestion des HAP issus du rabotage de la première phase (avenue du Général Leclerc) :</u>
Mise en œuvre en remblaiement inférieur au pied de la tour ;
Stockage de l'ensemble du rabotage à réaliser.

<u>Rue Croix Saint Gilles :</u>
=> sondage à réaliser au niveau du poteau d'incendie afin de vérifier les positionnements des réseaux ;
=> mise à jour du plan d'exe à réaliser ;
Constat d'huissier à remettre à jour en raison de l'état de l'habitation en ruine.

<u>Conduite eau potable :</u>
Réservoir :
Essai pression sur le 150 fonte réalisé ;
Prélèvement pour le contrôle de potabilité sur le 150 fonte prévu pour le 30/05 ;
Raccordement de cette conduite à prévoir – fouille à reboucher dans la continuité ;
Réseaux secs à mettre en œuvre ;
Raccordement de l'interconnexion sur l'ancien refoulement de la Touche à programmer ;
Rue Pasteur :
Rabotage de toute la ligne ;
Poursuite de la pose des trois conduites ;
Profondeur de pose 1,80 m et largeur d'ouverture de 1,30m ;
Dégagement du jeu de vannes en partie haute de la rue Croix Saint Gilles
=> Vérification des altimétries et contraintes de croisements ;
=> Mise à jour du plan d'exécution.

<u>Renouvellement des branchements :</u>
Relance effectuée par AGUR pour le n° 83 (demande d'un autre branchement d'eau potable et

d'assainissement) => pas de réponse ;
Renouvellement de l'ensemble des branchements – reste le passage de mur à réaliser ;

Désamiantage :
Poursuite du dégagement de quelques branchements à proximité immédiate des branchements d'eau potable ;
Branchement amiante perpendiculaire aux boites de branchement existantes ;
Raccord PVC/amiante dégagé non étanche ;

12/05/2023
Gestion des HAP issus du rabotage de la première phase (avenue du Général Leclerc) :
Mise en œuvre en remblaiement inférieur au pied de la tour.

Réalisation des sondages sur la rue Croix Saint Gilles :
=> sondage à réaliser au niveau du poteau d'incendie afin de vérifier les positionnements des réseaux ;
=> mise à jour du plan d'exe à réaliser.

Conduite eau potable :
Pose du regard (clapet anti-retour) dans l'enceinte des réservoirs ;
Fin de la pose des conduites dans l'enceinte des réservoirs pour la semaine 20 ;
Reprise de la pose des trois conduites à partir de la semaine 21 (22/05)

Renouvellement des branchements :
Poursuite du dégagement des branchements à l'aspiratrice jusqu'au n° 27 ;
Relance effectuée par AGUR pour le n° 83 (demande d'un autre branchement d'eau potable et d'assainissement) => pas de réponse ;
Présence de branchements bande bleu
=> vérification de leur âge = pas d'âge mais PN10 et non PN 16 => renouvellement à réaliser jusqu'à l'ancien compteur ;
Renouvellement des branchements coté paire entrepris afin de minimiser la gêne pour les riverains ;
Pas de réfection provisoire en enrobé à froid en raison de l'ouverture de la tranchée pour la pose des réseaux dans la continuité.

Désamiantage :
Poursuite du dégagement de quelques branchements à proximité immédiate des branchements d'eau potable ;
Contrainte de la localisation des culottes prise en compte ;
Désamiantage prévu après la pose de la conduite d'eau.

4. Points particuliers

Gestion de voirie
Travaux en route barrée sur l'ensemble des voies communales et RD.

CALITOM :
Continuité du dispositif mis en place sur la première tranche de travaux

Transport scolaire :
Pas de ligne

Branchement particulier :
Les niches à compteurs seront implantées autant que possible sur le domaine public.
Les projets d'urbanisme sont à faire remonter. La mairie se rapproche des pétitionnaires.

Défense incendie :
Déplacement du PI au niveau de la place Charle de Gaulle à mettre en retrait (1,40m) dans le massif végétal
Devis à transmettre par SOGEA pour le renouvellement de PI au niveau des réservoirs – Devis validé

Gestion des raccordements des branchements neufs sur compteurs :
Réalisé par SOGEA jusqu'au robinet d'arrêt / Compteur à fournir par AGUR
Assurer l'étanchéité au niveau des passage de mur.

Gestion des raccordements récents :
Les branchements réalisés en PEHD bande bleu (moins de 10 ans) ne seront pas renouvelés. Ils seront repris au plus court par électro-soudure.

5. Points techniques

Base de vie / stockage des matériaux :
Continuité de l'opération av G Leclerc

Gestion des vannes :
Les vannes seront manœuvrées par l'exploitant
L'état est à confirmer par l'exploitant pour les vannes.
Bouche à clé ronde = vanne
Bouche à clé carré = branchement
Bouche à clé hexagonale = purge

Gestion des dégradations du réseau ou des branchements d'eau potable :
A définir

Gestion des urgences de chantier :
Voir avec le conducteur de travaux

Repérage des vannes et branchements
L'exploitant AGUR procédera au repérage des ouvrages et aux essais de manœuvre.
Repérage des conduites neuves au niveau du giratoire rues de Condé/Pasteur => AGUR

IV. AUTRES

Nombre de jours d'intempéries : 0
Nombres de retards ou d'absences aux réunions : 0

Terrassement en cours :

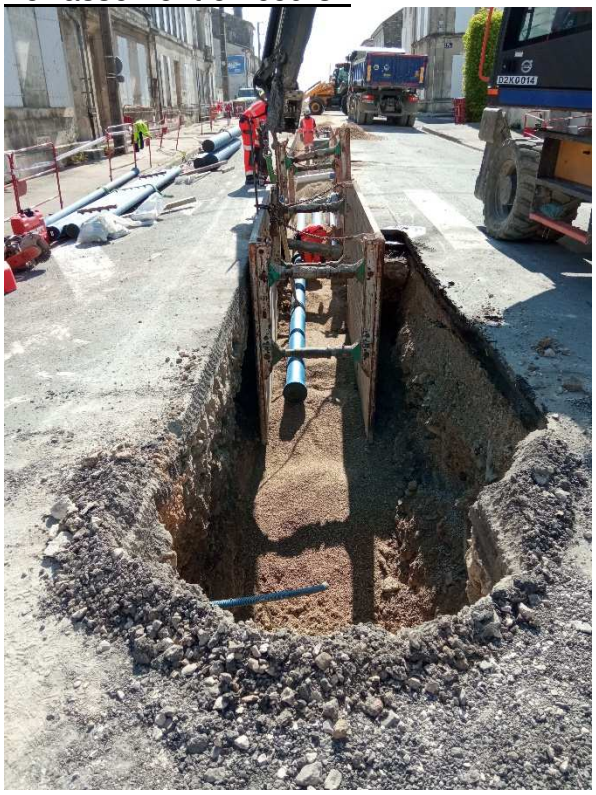

Raccordement ancien fuyard :

Rue Pasteur au niveau de la rue Croix Saint Gilles :

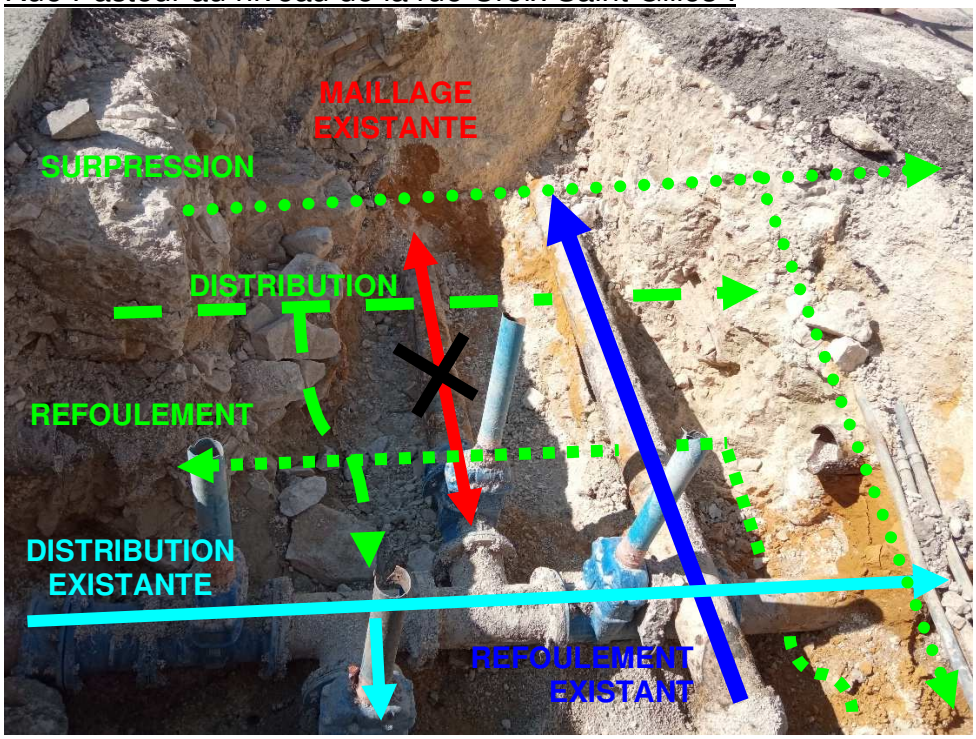

Maillage à déposer
Refoulement à poser au-dessous de l'ensemble des réseaux
Surpression à poser au-dessus de l'ensemble des réseaux
Distribution à poser entre l'ancien et le nouveau refoulements

Rabotage de la ligne de conduites :
